

工程监理意见书

2016年6月24日

单位：元

项目名称	2026年度温县北冷乡东周村、西周村、东南冷村、靳冯吝村仓储（标准化厂房）		
施工单位	河南正扬建设工程有限公司		
合同金额	2058312.18元	采购项目编号	温交易[2026]47号
中标工程量	建设地上一层门式钢架结构仓储一座，面积约1800平方米，进行水泥硬化地面。		
工程量变更追加(后附资料)			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	完成60%的工程量		
监理单位认定完成工程进度	已完成该项目60%的施工内容		
监理工程师签字和盖章	 <p>陈航 注册号 41011411 有效期 2028.07.19 河南建硕工程咨询有限公司</p>	单位项目负责人签字	王晨鸣
监理单位对工程质量评价	单位意见：同意  <p>单位盖章：3795</p>	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：同意  <p>单位盖章：</p>

工程款支付报审表（工程进度验收表）

工程名称：2026年度温县北冷乡东周村、西周村、东南冷村、靳冯吝村仓储（标准化厂房）

致：河南建硕工程咨询有限公司（项目监理机构）

根据施工合同约定，我方已完成 60% 工作，建设单位应在2026年6月25日前支付工程款共计（大写）：肆拾壹万壹仟陆佰陆拾贰元肆角肆分（小写：411662.44元），请予以审核。



审查意见：

1. 施工单位应得款为：411662.44元
2. 本期应扣款为：0元
3. 本期应付款为：411662.44元

专业监理工程师（签字）

2026年6月24日

周林

审核意见：

项目监理机构（盖章）




陈航
监理工程师（签字）
注册号 41011411
有效期 2028.07.19

2026年6月24日

陈航

审批意见：

建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）

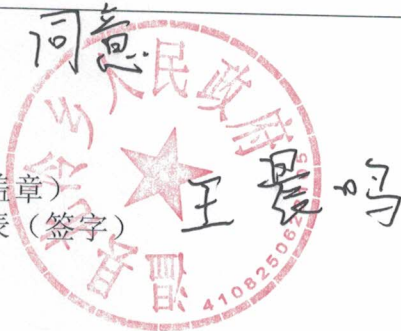

2026年6月25日

温县北冷乡东周村、西周村、东南冷村、靳冯林村仓储（标准化工厂）项目工程 60%工程量清单

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	备注
1	钢管柱	t	28.039	20	
2	钢梁	t	22.257	20	
3	现浇构件钢筋	t	9.664	7	
4	垫层	m3	13.66	13.66	
5	挖基坑土方	m3	834.11	834.11	



6 月 19 日

