

栾川县栾川乡人民政府
七里坪村东岭道路建设项目

竣工审核验收报告

栾川县栾川乡人民政府
七里坪村东岭道路建设项目

竣工审核验收报告

豫正工报字-LY (2024) 026 号

验收单位：河南正信工程咨询有限公司



2024 年 10 月 19 日

栾川县栾川乡人民政府 七里坪村东岭道路建设项目

竣工审核验收报告

豫正工报字-LY (2024) 026 号

栾川县栾川乡人民政府：

受栾川县栾川乡人民政府(以下简称委托人)委托,对栾川县栾川乡人民政府七里坪村东岭道路建设项目进行了竣工审核验收。合理编制并充分披露项目工程竣工情况,保证相关资料的真实性、合法性、完整性是贵单位的责任。我们的责任是对项目竣工验收发表审核意见。在审核验收过程中,我们结合工程项目实际情况,实施了审核验收工作。执行了包括查阅招标控制价清单、合同文件、图纸,现场勘察、测量等我们认为必要的审核验收程序。现将本次审核验收情况报告如下:

一、项目基本情况

通过委托人提供的栾川县栾川乡人民政府七里坪村东岭道路建设项目的相关文件资料,项目包括主要内容:

(一) 项目计划:

本工程为栾川县栾川乡人民政府七里坪村东岭道路建设项目,该项目位于栾川县栾川乡,主要工作内容为铺设沥青路面;原有道路结构层挖除修复,铺设 5cm 厚沥青面层,部分软基区域进行换填、原有沥青路面铣刨、粘贴抗裂布、加铺沥青底层。工期: 30 日历天,

合同价格为人民币叁佰伍拾柒万叁仟元整(小写金额:人民币3573000.00 元)。

(二)项目工程实施相关单位

- 1、项目建设单位:栾川县栾川乡人民政府;
- 2、项目施工单位:河南泓发市政工程有限公司;
- 3、项目监理单位:中鑫建筑工程有限公司
- 4、项目清单验收单位:河南正信工程咨询有限公司。

二、项目竣工审核验收情况

(一)项目验收内容依据:

- 1、该项目招标控制价清单、合同文件、图纸等;
- 2、河南正信工程咨询有限公司现场勘验资料。

(二)项目实际完成情况:

我单位于 2024 年 10 月 11 日在栾川县栾川乡人民政府,监理单位,施工单位等人员在场的情况下,依据现场勘测确认、清单及相关资料审核确认,对栾川县栾川乡人民政府七里坪村东岭道路建设项目的沥青路面进行测量和验收,实际完成情况如下:

项目竣工审核验收结论：

栾川县栾川乡人民政府七里坪村东岭道路建设项目清单已由监理单位中鑫建筑工程有限公司报告认定该项目质量合格。我单位进行工程量审核验收，该项目已完成建设。

本项目竣工审核验收报告仅供委托人办理栾川县栾川乡人民政府七里坪村东岭道路建设项目验收事宜提供工程量参考依据，不得用作其他用途。

编制人：



审核人：



河南正信工程咨询有限公司

2024 年 10 月 19 日



2024年栾川县栾川乡七里坪村东岭道路建设
工程量验收表（加油站）

序号	项 目 名 称	单位	投标 工程量	实际 工程量
一	垫层（水泥稳定碎石）			
	18cm水泥稳定碎石上基层	m2	4520.00	照图纸设计
	18cm水泥稳定碎石下基层	m2	4420.00	照图纸设计
二	特殊地区路基处理（软土路基处理垫层）			
	路基下换填碎石，平均80cm厚	m3	1420.00	照图纸设计
三	透层和黏层			
	透层	m2	5509.86	5531.080
	黏层	m2	5509.86	5531.080
	下封层	m2	5509.86	5531.080
四	热拌沥青混合料面层			
	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）	m2	5509.86	5531.080
	5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）	m2	5509.86	5531.080
五	场地清理（挖除旧路面）			
	挖除水泥稳定碎石基层36cm厚	m3	979.20	照图纸设计

2024年栾川县栾川乡七里坪村东岭道路建设
工程量验收表（景区内）

根据图纸设计，景区内路面分为三种：
I类：黏层+4cm细粒式沥青混凝土
II类：封层+透层+4cm中粒式沥青混凝土+黏层+3cm细粒式沥青混凝土
III类：封层+透层+5cm粗粒式沥青混凝土+透层+4cm中粒式沥青混凝土+黏层+3cm细粒式沥青混凝土
现场实测景区内面积：13846.58m2；
洞内面积：3230.5m2；
根据现场测量和施工资料，验收工程量如下：
III类路面面积根据照片为2350.94m2；
I类路面面积：381.5*7=2670.5m2；
II类路面面积：13846.58-2350.94+7*80=12055.06m2

序号	项 目 名 称	单 位	投 标 工 程 量	实 际 工 程 量	备 注
一	场地清理（挖除旧路面）				
	铣刨现状5cm沥青	m2	3436.00	照图纸设计	
	挖除10cm厚路面	m3	235.1	照图纸设计	
	透层和黏层				
二	透层	m2	16789	16756.94	II类+III类+III类
	黏层	m2	16963.1	17076.50	I类+II类+III类
	热沥青同步碎石封层	m2	13768	14406.00	II类+III类
三	抗裂布				

2024年栾川县栾川乡七里坪村东岭道路建设
工程量验收表（景区内）

	自粘式玄武岩纤维抗裂布 (横缝50cm, 纵缝100cm宽)	m2	745.6	745.60	
四	热拌沥青混合料面层				
	3cm细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	m2	14438	14406.00	Ⅱ类+Ⅲ类
	4cm细粒式沥青混凝土 (AC-14C)	m2	2525.1	2670.50	Ⅰ类
	4cm中粒式沥青混凝土 (AC-16C)	m2	14438	14406.00	Ⅱ类+Ⅲ类
	5cm中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	m2	2351	0.00	
	5cm粗粒式沥青混凝土 (AC-20C)	m2	0	2350.94	Ⅲ类












2024年栾川县栾川乡七里坪村东岭道路建设 验收单








序号	项目名称	单位	工程量计算式
1.	老君山口-加油站		
	A段 K0-K103	} m ²	
	K157-K235		总面积: 5531.08 m ² (pt1-Pt163)
	B段: K0-K170		
2.	老君山沟-沟口		总面积: 13846.58 m ² (pt164-pt694)
3.	沟内:		L=461.5m, b=7.0m, 厚度4cm.
			总面积: 461.5×7.0=3230.5 m ²
		其中:	II类路面长度: 80m
			I类路面长度: 381.5m
验收人员签字	郭栋 白永平 吴永新 牛得青		







老君山挖补工程量


桩号	长(m)	宽 (m)	厚 (cm)	面积 (m2)
K0+150-K0+157	7.4	3.3	10	24.4
K0+157-K0+173	16	2	10	32
K0+200-K0+204	14.3	4	10	57.2
K0+204-K0+215	10.5	2	10	21
K0+260-K0+400	140	2	10	240
K0+400-K0+468	68.3	4	10	273.2
K0+470-K0+484	13.6	4.4	10	59.84
K0+510-K0+550	40	3	10	120
K0+520-K0+572	22.3	2	10	44.6
K0+520-K0+509	9	2	10	18
K0+620-K0+635	14.6	2	10	29.2
K0+630-K0+687	56.8	2	10	113.6
K0+700-K0+757	57.3	2	10	114.6
K0+730-K0+763	33	2	10	66
K0+763-K0+774	11.2	3.5	10	39.2
K0+741-K0+757	16	2	10	32
K0+770-K0+778	8.4	2	10	16.8
K0+756-K0+768	12.3	2	10	24.6
K0+776-K0+792	16.2	4	10	64.8

K0+790-K0+802	11.7	2	10	23.4
K0+793-K0+809	15.7	2	10	31.4
	6.9	3	10	20.7
	23	4	10	92
	19	2	10	38
	324	2	10	648
	20.2	4	10	80.8
	6.4	4	10	25.6
合计				2350.94
过路管（PE管）	共计12根（带管箍），每根长6m，每根478元，合计5736元；C30商砼36m³			

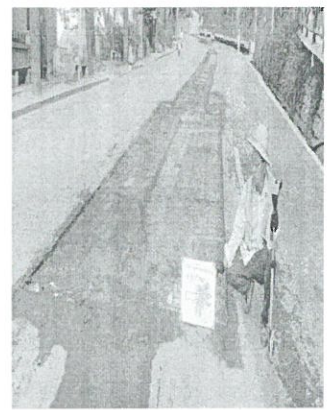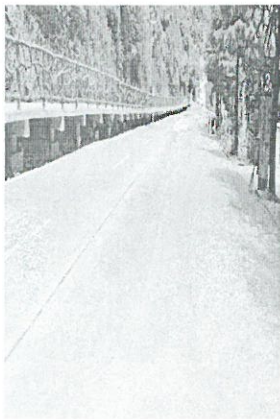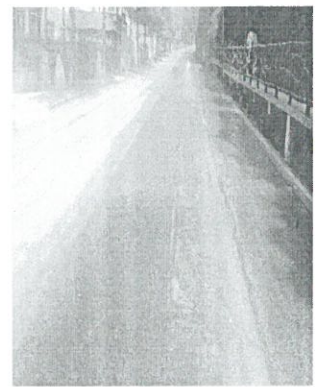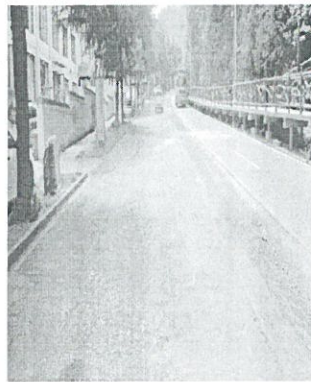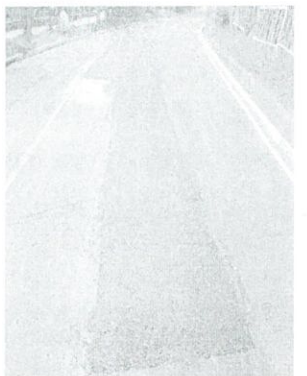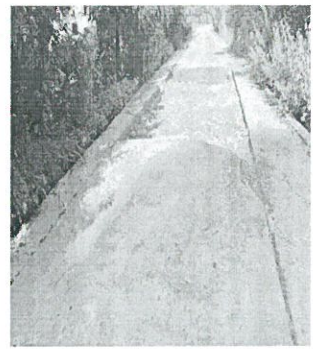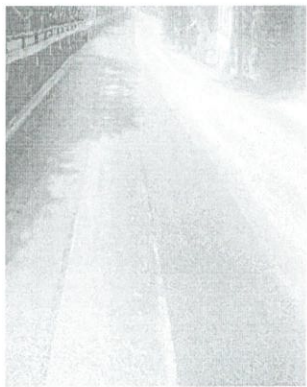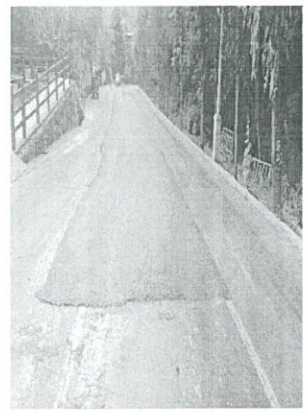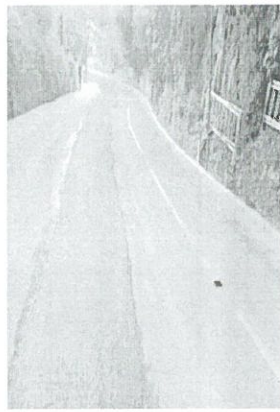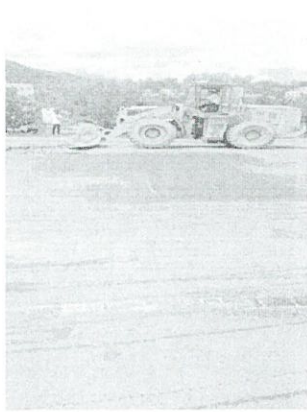

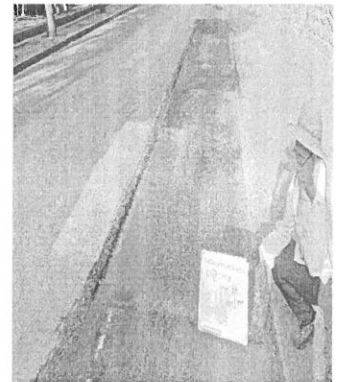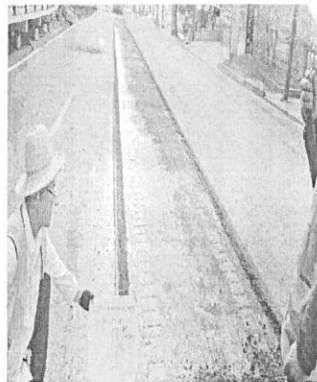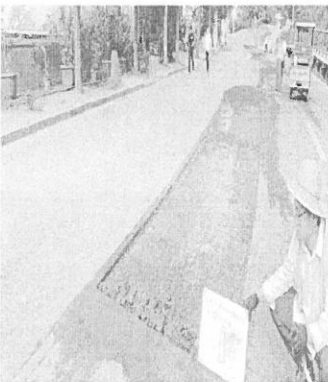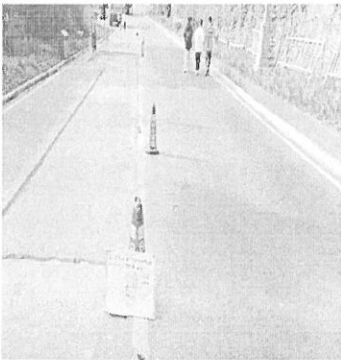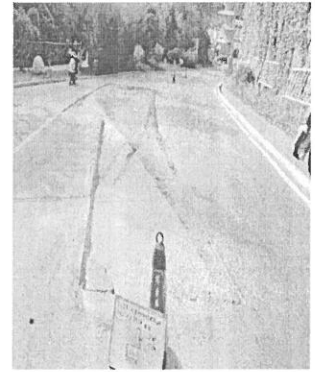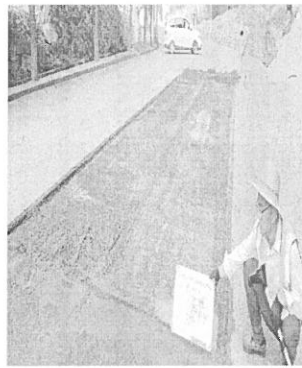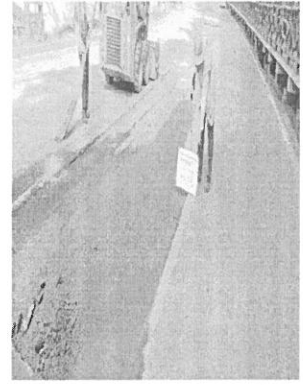

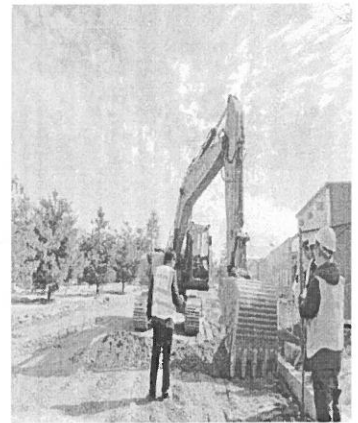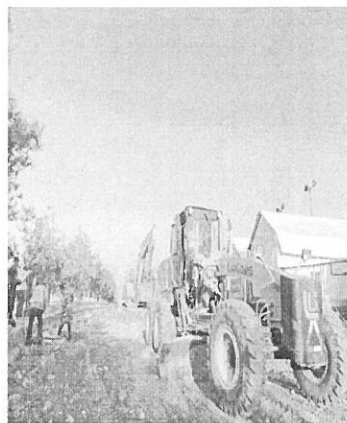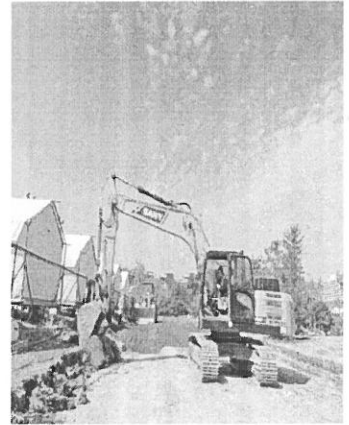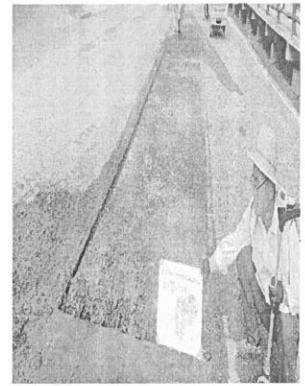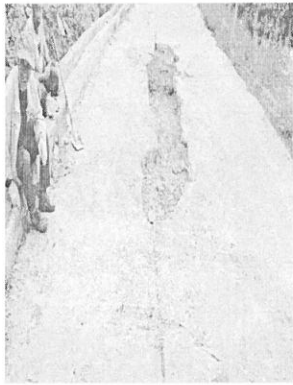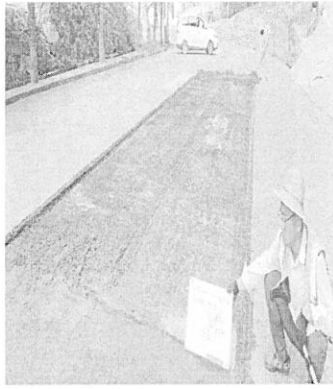

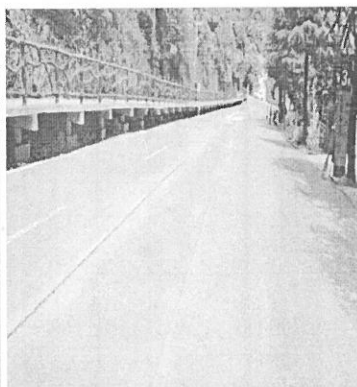



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:21
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.6490436 E
海拔: 33.777820 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:22
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.648953 E
海拔: 33.777809 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:13
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.647794 E
海拔: 33.777325 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:56
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.643708 E
海拔: 33.753615 N

今日水印
水印相机




工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:29
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.647503 E
海拔: 33.777328 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:55
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.643677 E
海拔: 33.753525 N

今日水印
水印相机

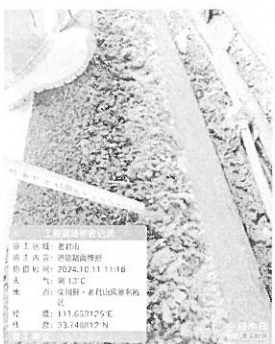

工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 11:18
天气: 晴 13℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.653125 E
海拔: 33.748812 N

今日水印
水印相机




工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:36
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.647459 E
海拔: 33.777352 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:56
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.643708 E
海拔: 33.753615 N

今日水印
水印相机

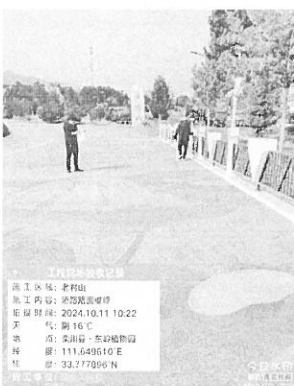

工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:22
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.649010 E
海拔: 33.777826 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:49
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.642857 E
海拔: 33.756253 N

今日水印
水印相机



工程现场记录
施工区域: 老村山
施工内容: 道路路面摊铺
拍摄时间: 2024.10.11 10:22
天气: 晴 16℃
地点: 老村山、老村山风景区
经纬度: 111.649056 E
海拔: 33.777822 N

今日水印
水印相机

