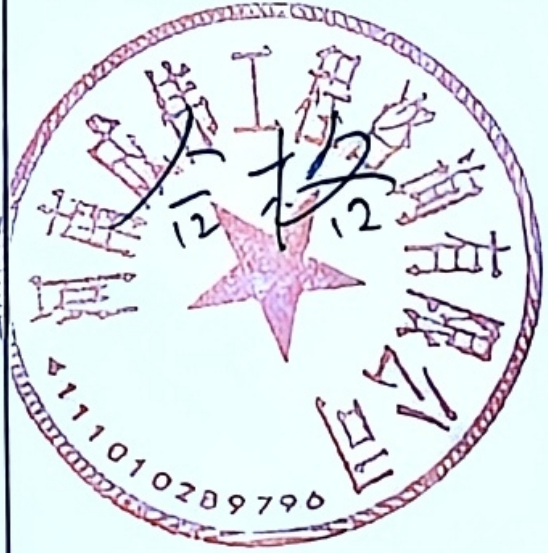


工程监理意见书

2026年7月24日

单位：元

项目名称	2026 年温县铁棍山药(怀药)冷链仓储建设项目(包 2)		
施工单位	河南豫仁建设工程有限公司		
合同金额	557515.7 元		
中标工程量	回填土 1081m3;C20 楼地面垫层 8cm 厚 142.56m3;C20 楼地面垫层 12cm 厚 213.84m3;C25 楼地面垫层 20cm 厚 76m3;屋面改造 1909.95m2。		
工程量变更追加	无		
工程量变更减少	无		
目前已完成工程量	100%		
监理单位	河南成伟工程咨询有限公司		
监理单位认为形象进度	100%	监理工程师签字	
监理单位对工程质量的评价		项目单位对工程完成情况的意见	
