

河南省药品监督管理局
花园路 21 号院金质大厦维修改造项目
竣工财务决算审计报告

委托单位：河南省药品监督管理局

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

联系电话：0371-60110661

传真号码：0371-60309106

河南省药品监督管理局
花园路 21 号院金质大厦维修改造项目
竣工财务决算审计报告

利安达专字[2025]豫 A0112 号

河南省药品监督管理局：

我们接受委托，对河南省药品监督管理局（以下简称“项目建设单位”）提供的花园路 21 号院金质大厦维修改造项目竣工财务决算报表进行了专项审计。

按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》和《基本建设财务规则》的规定编制竣工财务决算报表是项目建设单位管理层的责任。注册会计师的责任是在项目建设单位对所提供的竣工财务决算资料的真实性、合法性、完整性负责的基础上，遵循独立科学、客观公正、实事求是的原则，实施相关审计工作后，对竣工财务决算发表专项审计意见。注册会计师按照《中国注册会计师审计准则》和财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了专项审计工作，遵守了职业道德规范，计划和实施审计工作以对竣工财务决算不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。我们相信已获取的审计证据是充分、适当的，为其发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目批复情况。

根据《河南省市场监督管理局关于申请搬迁改造资金的请示》（豫市监文（2023）53 号），河南省药品监督管理局机关及其直属机构从花园路 127 号院整体搬迁至花园路 21 号院金质大厦。因金质大厦内部结构多数为宾馆用房，不适合办公，需按照办公用房标准对金质大厦进行整体改造。

根据《河南省财政厅关于花园路 21 号院金质大厦办公用房改造资金（丁 1431）



的意见》，河南省药品监督管理局提请河南省财政厅对花园路 21 号院金质大厦维修改造项目进行预算评审，评审后项目预算 3,062.80 万元(不包含安全鉴定、装修设计)，包含安全鉴定、装修设计的采购预算价的总项目预算为 3,302.80 万元。

(二) 项目建设内容

项目建设内容：花园路 21 号院金质大厦维修改造，建筑面积 24,485.00 m²；层数：地下 1 层，地上 16 层，局部裙房 4 层。工程范围：主体加固、屋面、装修、水、电、通风、智能建筑、消防、电梯设备维修、空调更换等。

需完成工程量：花园路 21 号院金质大厦维修改造，建筑面积 24,485.00 m²。

1、项目的主要参建单位：

设计单位：河南省第二建设集团有限公司

施工单位：北京华美装饰工程有限公司、河南省海通消防安全工程有限公司、河南九鼎电梯工程有限公司

监理单位：中科华水工程管理有限公司

招投标公司：河南恒创工程咨询有限公司、河南豫信招标有限责任公司、河南佳辰工程管理有限公司

2、项目招投标情况：

项目严格遵循《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，进行安全鉴定、装修设计、装修监理、装修施工、装修消防、电梯维修等招采活动。

委托河南佳辰工程管理有限公司担任安全鉴定招标的代理机构。项目采购预算为 800,000.00 元，安全鉴定期限为合同签订之日起 15 日历天。最终确定河南科创检测技术有限公司为安全鉴定成交供应商，成交金额为 550,000.00 元。

委托河南佳辰工程管理有限公司担任装修设计招标的代理机构。项目采购预算为 1,600,000.00 元，服务期限为合同签订之日起 45 日历天。最终确定河南省第二建设集团有限公司为装修设计成交供应商，成交金额为 1,211,600.00 元。

委托河南豫信招标有限责任公司担任装修监理招标的代理机构。项目采购预算为 295,800.00 元，服务期限为同整个施工工期及保修期。最终确定中科华水工程管理有限公司



限公司为装修监理成交供应商，成交金额为 288,000.00 元。

委托河南恒创工程咨询有限公司担任装修施工、装修消防招标的代理机构。项目采购预算为 29,457,000.00 元，服务期限为 210 日历天。最终确定联合体北京华美装饰工程有限公司、河南省海通消防安全工程有限公司为装修施工、装修消防成交供应商，成交金额为 28,867,893.65 元。

委托河南豫信招标有限责任公司担任电梯维修招标的代理机构，项目采购预算为 736,000.00 元，服务期限为合同签订后 20 个工作日内完成备货，具体开工日期以招标方通知为准，维修时间为 30 天，服务期限到质保期结束为止。最终确定河南九鼎电梯工程有限公司为电梯维修成交供应商，成交金额为 697,000.00 元。

3、工程建设周期及竣工验收情况：

装修施工周期：自 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 7 月 15 日。2025 年 8 月 21 日，项目建设单位河南省药品监督管理局与设计单位河南省第二建设集团有限公司、施工单位北京华美装饰工程有限公司、监理单位中科华水工程管理有限公司，对河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目-装修施工进行了验收，并出具了工程竣工验收意见表。工程竣工验收意见表表明，验收合格。

消防工程周期：自 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 7 月 15 日。2025 年 8 月 18 日，河南省华鼎建设咨询有限公司对消防设施进行检测，出具消防设施检测报告，检测结论为合格。2025 年 8 月 21 日，项目建设单位河南省药品监督管理局与设计单位河南省第二建设集团有限公司、施工单位河南省海通消防安全工程有限公司、监理单位中科华水工程管理有限公司，对河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目-消防工程进行了验收，并出具了工程竣工验收意见表。工程竣工验收意见表表明，验收合格。

电梯维修周期：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 7 月 31 日。2025 年 7 月 1 日，河南省特种设备检验技术研究院对 4 部电梯进行检验，并出具了电梯监督检验报告，检验结论为合格。2025 年 8 月 15 日，项目建设单位河南省药品监督管理局与施工单位河南九鼎电梯工程有限公司、监理单位中科华水工程管理有限公司，对河南省药品监



督管理局花园路 21 号院金质大厦电梯设备维修服务进行了验收，并出具了工程竣工验收证书。工程竣工验收证书表明，存在问题已全部处理完毕，并验收合格。

二、竣工财务决算表编制范围

1、时间范围：2025 年 10 月至 2025 年 11 月

2、对象范围：河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目

三、资金来源及实际到位审计情况

1、资金到位情况：资金来源为财政专项资金。河南省财政厅同意调整河南省药品监督管理局资金 1,157.69 万元，安排 2025 年金质大厦维修项目专项资金 1,907.00 万元，调整其他资金 98.00 万元，共计 3,162.69 万元用于花园路 21 号院办公用房改造的相关支出；办公用房改造项目的缺口部分，优先统筹河南省药监局部门预算资金，如仍有不足，根据预算执行情况另行考虑。

2、资金支付情况：截至 2025 年 9 月 30 日，根据相关合同、结算单据及付款凭证等资料，该项目已累计支付资金 30,313,253.09 元，未支付金额为 3,337,332.45 元。其中：维修改造建筑工程合同价 28,867,893.65 元，因设计变更和漏项等原因，审定后工程竣工结算价为 30,756,324.54 元。

项目支付明细表

单位：元

项目	单位名称	实际投资	已支付	未支付
建筑工程费用	北京华美装饰工程有限公司	27,641,772.50	24,877,595.25	2,764,177.25
	河南省海通消防安全工程有限公司	3,114,552.04	2,803,096.84	311,455.20
电梯维修	河南九鼎电梯工程有限公司	697,000.00	627,300.00	69,700.00
安全鉴定	河南科创检测技术有限公司	550,000.00	550,000.00	
装修设计	河南省第二建设集团有限公司	1,211,600.00	1,211,600.00	
装修审图	河南建工施工图审技术服务有限公司	63,661.00	63,661.00	
装修造价	河南新时代工程管理有限公司	36,000.00	36,000.00	
装修监理	中科华水工程管理有限公司	288,000.00	144,000.00	144,000.00
工程结算审核	建友工程服务有限公司	3,000.00		3,000.00



项目	单位名称	实际投资	已支付	未支付
竣工财务决算 审计	利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）河南分所	45,000.00		45,000.00
投资合计		33,650,585.54	30,313,253.09	3,337,332.45

四、项目投资完成情况及交付使用资产情况

截至 2025 年 9 月 30 日，河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目累计完成投资 33,650,585.54 元，其中：待核销基建支出 33,650,585.54 元，交付使用资产 0.00 元。具体明细如下：

项目投资与采购预算对比表

单位：元

项目	交付面积（m²）	采购预算	实际投资	超节支额	超节率（%）
建筑工程费用	24,485.00	29,457,000.00	30,756,324.54	1,299,324.54	4.41%
电梯维修	4 台	736,000.00	697,000.00	-39,000.00	-5.30%
安全鉴定		800,000.00	550,000.00	-250,000.00	-31.25%
装修设计		1,600,000.00	1,211,600.00	-388,400.00	-24.28%
装修监理		295,800.00	288,000.00	-7,800.00	-2.64%
装修审图		139,153.49	63,661.00	8,507.51	6.61%
装修造价			36,000.00		
工程结算审核			3,000.00		
竣工财务决算 审计			45,000.00		
投资合计		33,027,953.49	33,650,585.54	622,632.05	1.89%

五、审计意见

我们审计了项目建设单位河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目竣工财务决算报表，我们认为，后附的项目竣工财务决算报表的编制符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》和《基本建设财务规则》的相关规定，公允反应了河南省药品监督管理局花园路 21 号院金质大厦维修改造施工项目的投资及支付情况，财务核算和管理符合有关基本建设财务规则的规定。

因金质大厦产权不在河南省药品监督管理局名下，若产权变更至河南省药品监督管理局，建议根据固定资产管理办法调整维修改造费用支出。



附表 1：基本建设项目竣工财务决算报表

附表 2：基本建设项目竣工财务决算审核表

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·郑州

中国注册会计师



中国注册会计师



2025 年 12 月 5 日



附表1



项目单位：河南省药品监督管理局

主管部门：河南省市场监督管理局

建设项目名称：花园路21号院金质大厦维修改造项目

建设性质：维修改造

基本建设项目竣工财务决算报表

项目单位负责人：田文才

项目单位财务负责人：黄纲

项目单位联系人及电话：董翠 0371-65567180

编报日期：2025年9月30日

决算基准日：2025年9月30日

项目竣工财务决算表(1-2)

项目名称: 花园路21号院金质大厦维修改造项目

单位: 元

资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款	30,313,253.09	一、基本建设支出	
1. 中央财政资金	-	(一) 交付使用资产	
其中: 一般公共预算资金		1. 固定资产	
中央基建投资		2. 流动资产	
财政专项资金		3. 无形资产	
政府性基金		(二) 在建工程	
国有资本经营预算安排的基建项目资金		1. 建筑安装工程投资	
2. 地方财政资金	30,313,253.09	2. 设备投资	
其中: 一般公共预算资金		3. 待摊投资	
地方基建投资		4. 其他投资	
财政专项资金	30,313,253.09	(三) 待核销基建支出	33,650,585.54
政府性基金		(四) 转出投资	
国有资本经营预算安排的基建项目资金		二、货币资金合计	
二、部门自筹资金(非负债性资金)		其中: 银行存款	
三、项目资本		财政应返还额度	
1. 国家资本		其中: 直接支付	
2. 法人资本		授权支付	
3. 个人资本		现金	
4. 外商资本		有价证券	
四、项目资本公积		三、预付及应收款合计	
五、基建借款		1. 预付备料款	
其中: 企业债券资金		2. 预付工程款	
六、待冲基建支出		3. 预付设备款	
七、应付款合计	3,337,332.45	4. 应收票据	
1. 应付工程款	3,075,632.45	5. 其他应收款	
2. 应付设备款	69,700.00	四、固定资产合计	
3. 应付票据		固定资产原价	
4. 应付工资及福利费		减: 累计折旧	
5. 其他应付款	192,000.00	固定资产净值	
八、未交款合计		固定资产清理	
1. 未交税金		待处理固定资产损失	
2. 未交结余财政资金			
3. 未交基建收入			
4. 其他未交款			
合计	33,650,585.54	合计	33,650,585.54

补充资料: 基建借款期末余额: 0元

基建结余资金: 0元

备注: 资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。

资金情况明细表(1-3)

项目名称:花园路21号院金质大厦维修改造项目		单位:元	
资金来源类别	合 计		备注
	预算下达或概算批准金额	实际到位金额	需备注预算下达文号
一、财政资金拨款			
1. 中央财政资金	-	-	
其中:一般公共预算资金			
中央基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
政府统借统还非负债性资金			
2. 地方财政资金	31,626,932.60	33,650,585.54	
其中:一般公共预算资金			
地方基建投资			
财政专项资金	31,626,932.60	33,650,585.54	
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
行政事业性收费			
政府统借统还非负债性资金			
二、项目资本金			
其中:国家资本			
三、银行贷款			
四、企业债券资金			
五、自筹资金			
六、其他资金			
合 计	31,626,932.60	33,650,585.54	

补充资料: 项目缺口资金: 0元
 缺口资金落实情况: 无资金缺口。

交付使用资产总表(1-4)

项目名称:花园路21号院金质大厦维修改造项目



单位: 元

序号	单项工程名称	总计	固定资产				流动资产	无形资产
			合计	建筑物及构筑物	设备	其他		
	合 计	-	-	-	-	-	-	-

交付单位:

负责人:

接收单位:

负责人:

盖章:

年 月 日

盖章:

年 月 日

交付使用资产明细表(1-5)

项目名称:花园路21号院金质大厦维修改造项目



序号	单项工程名称	固定资产										流动资产		无形资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具						名称	金额	名称	金额
		结构	面积	金额	其中:分 摊待摊投 资	名称	规格型号	数量	金额	其中:设 备安装费	其中:分 摊待摊投 资				
1															
	合 计		-	-	-			-	-	-	-		-		-

单位:元

交付单位: 负责人: 接收单位: 负责人:

盖章: 年 月 日 盖章: 年 月 日

待摊投资明细表 (1-6)

项目名称: 花园路21号院金质大厦维修改造项目

单位: 元

项 目	金 额	项 目	金 额
1. 勘察费		25. 社会中介机构审计(查)费	45,000.00
2. 设计费	1,211,600.00	26. 工程检测费	
3. 研究试验费		27. 设备检验费	
4. 环境影响评价费		28. 负荷联合试车费	
5. 监理费	288,000.00	29. 固定资产损失	
6. 土地征用及迁移补偿费		30. 器材处理亏损	
7. 土地复垦及补偿费		31. 设备盘亏及毁损	
8. 土地使用税		32. 报废工程损失	
9. 耕地占用税		33. (贷款)项目评估费	
10. 车船税		34. 国外借款手续费及承诺费	
11. 印花税		35. 汇兑损益	
12. 临时设施费		36. 坏账损失	
13. 文物保护费		37. 借款利息	
14. 森林植被恢复费		38. 减: 存款利息收入	
15. 安全生产费		39. 减: 财政贴息资金	
16. 安全鉴定费	550,000.00	40. 企业债券发行费用	
17. 网络租赁费		41. 经济合同仲裁费	
18. 系统运行维护监理费		42. 诉讼费	
19. 项目建设管理费		43. 律师代理费	
20. 代建管理费		44. 航道维护费	
21. 工程保险费		45. 航标设施费	
22. 招投标费		46. 航测费	
23. 合同公证费		47. 其他待摊投资性质支出	102,661.00
24. 可行性研究费		合 计	2,197,261.00

待核销基建支出明细表(1-7)

项目名称:花园路21号院金质大厦维修改造项目

单位:元

不能形成资产的财政投资支出				用于家庭或个人的财政补助支出			
支出类别	单位	数量	金额	支出类别	单位	数量	金额
1.江河清障				1.补助群众造林			
2.航道清淤				2.户用沼气工程			
3.飞播造林				3.户用饮水工程			
4.退耕还林(草)				4.农村危房改造工程			
5.封山(沙)育林(草)				5.垦区及林区棚户区改造			
6.水土保持				...			
7.城市绿化							
8.毁损道路修复							
9.护坡及清理							
10.取消项目可行性研究费							
11.项目报废							
12.水库水毁修复							
13.房屋维修改造	m²	24,485.00	33,650,585.54				
...				合 计	m²	24,485.00	33,650,585.54

附表2

评审机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 评审项目名称：花园路21号院金质大厦维修改造项目

评审小组负责人及联系电话：王园园 0371-60110661

基本建设项目竣工财务决算审核表

委托评审单位及委托文号：河南省药品监督管理局

委托评审时间及时限：2025年9月30日


实际评审起止时间：2025年10月23日-12月3日

评审报告报送时间：2025年12月5日

项目竣工财务决算审核汇总表 (2-1)

项目名称: 花园路21号院金质大厦维修改造项目

序号	工程项目及费用名称	批准概算		送审投资		审定投资		审定投资较概算增减额	备注
		数量	金额	数量	金额	数量	金额		
	总计		-		33,650,585.54		33,650,585.54		
一	建筑工程费用		-	24485m²	30,756,324.54	24485m²	30,756,324.54		
1	装修施工			24485m²	27,641,772.50	24485m²	27,641,772.50		
2	装修消防				3,114,552.04		3,114,552.04		
二	电梯维修			4台	697,000.00	4台	697,000.00		
三	待摊投资				2,197,261.00		2,197,261.00		

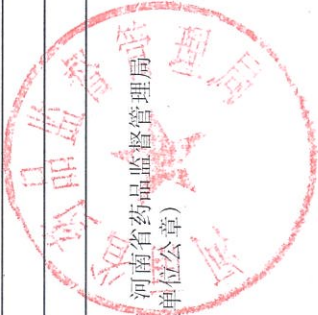

项目单位: 河南省药品监督管理局
(盖单位公章)

负责人签字:

2025年12月5日



评审机构: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
(盖单位公章)

评审负责人签字:

2025年12月5日

王同国

资金情况审核明细表(2-2)

项目名称：花园路21号院金质大厦维修改造项目

资金来源类别		合 计		单位：元
		预算下达或概算批准金额	实际到位金额	备注
一、财政资金拨款		31,626,932.60	33,650,585.54	需备注预算下达文号
1. 中央财政资金				
其中：一般公共预算资金				
中央基建投资				
财政专项资金				
政府性基金				
国有资本经营预算安排的基建项目资金				
政府统借统还非负债性资金				
2. 地方财政资金		31,626,932.60	33,650,585.54	
其中：一般公共预算资金				
地方基建投资				
财政专项资金		31,626,932.60	33,650,585.54	
政府性基金				
国有资本经营预算安排的基建项目资金				
行政事业性收费				
政府统借统还非负债性资金				
二、项目资本金		-	-	
其中：国家资本				
三、银行贷款				
四、企业债券资金				
五、自筹资金				
六、其他资金				
合 计		31,626,932.60	33,650,585.54	

项目单位：河南省药品监督管理局

负责人签字： 2025年12月5日

评审机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

评审负责人签字： 2025年12月5日

待摊投资审核明细表 (2-3)

项目名称: 花园路21号院金质大厦维修改造项目

单位: 元

项 目	审定金额	项 目	审定金额
1. 勘察费		25. 社会中介机构审计(查)费	45,000.00
2. 设计费	1,211,600.00	26. 工程检测费	
3. 研究试验费		27. 设备检验费	
4. 环境影响评价费		28. 负荷联合试车费	
5. 监理费	288,000.00	29. 固定资产损失	
6. 土地征用及迁移补偿费		30. 器材处理亏损	
7. 土地复垦及补偿费		31. 设备盘亏及毁损	
8. 土地使用税		32. 报废工程损失	
9. 耕地占用税		33. (贷款)项目评估费	
10. 车船税		34. 国外借款手续费及承诺费	
11. 印花税		35. 汇兑损益	
12. 临时设施费		36. 坏账损失	
13. 文物保护费		37. 借款利息	
14. 森林植被恢复费		38. 减: 存款利息收入	
15. 安全生产费		39. 减: 财政贴息资金	
16. 安全鉴定费	550,000.00	40. 企业债券发行费用	
17. 网络租赁费		41. 经济合同仲裁费	
18. 系统运行维护监理费		42. 诉讼费	
19. 项目建设管理费		43. 律师代理费	
20. 代建管理费		44. 航道维护费	
21. 工程保险费		45. 航标设施费	
22. 招投标费		46. 航测费	
23. 合同公证费		47. 其他待摊投资性质支出	102,661.00
24. 可行性研究费		合 计	2,197,261.00

项目单位: 河南省药品监督管理局

负责人签字:

2025年 12月 5 日

评审机构: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

评审负责人签字: 王国民

2028年 12月 5 日

交付使用资产审核明细表 (2-4)

项目名称: 花园路21号院金质大厦维修改造项目

[illegible]

项目单位：河南省药品监督管理局

负责人签字:

2015年12月5日

评审机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

评审负责人签字:

2025年12月5日

待核销基建支出审核明细表 (2-6)

项目名称: 花园路21号院金质大厦维修改造项目

单位:元

不能形成资产部分的财政投资支出				用于家庭或个人的财政补助支出			
支出类别	单位	数量	金额	支出类别	单位	数量	金额
1. 江河清障				1. 补助群众造林			
2. 航道清淤				2. 户用沼气工程			
3. 飞播造林				3. 户用饮水工程			
4. 退耕还林(草)				4. 农村危房改造工程			
5. 封山(沙)育林(草)				5. 垦区及林区棚户区改造			
6. 水土保持				...			
7. 城市绿化							
8. 毁损道路修复							
9. 护坡及清理							
10. 取消项目可行性研究费							
11. 项目报废							
12. 水库水毁修复							
13. 房屋维修改造	m²	24,485.00	33,650,585.54				
...				合 计	m²	24,485.00	33,650,585.54



项目单位: 河南省药品监督管理局

负责人签字:


评审机构: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所

评审负责人签字: 王国园

2015年12月5日

2015年12月5日

请于每年1月1日至6月30日



营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91410100MA40D5AH1R

(副本)(1-1)

名称

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

成立日期

2014年02月18日

类型

非公司私营企业

营业期限

负责人

周洪涛

营业场所


河南自贸试验区郑州片区(郑东)中
兴南路90号嘉亿东方大厦2607号

经营范围

审查企业会计报表；出具审计报告；验证
企业资本；出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务；出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

登记机关

2019



此复印件，仅供本报告使用，他用无效




市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所分所

执业证书

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所

负责人：周洪涛

经营场所：河南省自贸试验区郑州片区(郑东)
中兴南路90号嘉亿东方大厦2607号

分所执业证书编号：110001544101

批准执业文号：豫财办会[2008] 20号

批准执业日期：2008年4月15日



此复印件，仅供本报告使用，他用无效

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关：河南省财政厅

2025年6月18日

中华人民共和国财政部制





姓名 赵星伟
Full name 赵星伟
性别 男
Sex 男
出生日期 1982-06-16
Date of birth 1982-06-16
工作单位 利安达会计师事务所(普通合伙)河南分所
Working unit 利安达会计师事务所(普通合伙)河南分所
身份证号码 412702198206160516
Identity card No. 412702198206160516



此复印件，仅供本报告使用，他用无效



赵星伟 110001684763

证书编号: 110001684763
No. of Certificate: 110001684763

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance 2014 /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日 日/d



王园园

姓名	王园园
性别	女
出生日期	1980-08-11
工作单位	河南安泰会计师事务所有限公司
身份证号	410100198008110000
执业证书号	41010000000000000000



此复印件，仅供本报告使用，他用无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王园园 110001547469

证书编号: 110001547469
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d
