

栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、
8 组公路扩建硬化工程项目

竣工审核验收报告

豫正工报字-LY（2025）002 号

验收单位：河南正信工程咨询有限公司

2025 年 1 月 20 日



栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、 8 组公路扩建硬化工程项目

竣工审核验收报告

豫正工报字-LY（2025）002 号

栾川县栾川乡人民政府：

受栾川县栾川乡人民政府(以下简称委托人)委托，对栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、8 组公路扩建硬化工程项目进行了竣工审核验收。合理编制并充分披露项目工程竣工情况，保证相关资料的真实性、合法性、完整性是贵单位的责任。我们的责任是对项目竣工验收发表审核意见。在审核验收过程中，我们结合工程项目实际情况，实施了审核验收工作。执行了包括查阅招标文件、控制价清单、成交通知书、合同文件，现场勘察、测量等我们认为必要的审核验收程序。现将本次审核验收情况报告如下：

一、项目基本情况

通过委托人提供的栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、8 组公路扩建硬化工程项目的相关文件资料，项目包括主要内容：

（一）项目计划：

本工程为栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、8 组公路扩建硬化工程项目，该项目位于栾川县栾川乡百炉村，主要工作内容为挖除水泥混凝土路面、新砌浆砌（片）块石、开挖及回填土方、安装 PVC 排水管、铺设水泥混凝土面板及沥青混凝土路面。工期：40

日历天，合同价格为人民币壹佰贰拾肆万陆仟伍佰元整(小写金额：人民币 1246500.00 元)。

(二)项目工程实施相关单位

- 1、项目建设单位:栾川县栾川乡人民政府;
- 2、项目施工单位:河南乐泰建筑工程有限公司;
- 3、项目监理单位:成泸工程咨询有限公司栾川分公司
- 4、项目清单验收单位:河南正信工程咨询有限公司。

二、项目竣工审核验收情况

(一)项目验收内容依据:

- 1、该项目招标文件、控制价清单、成交通知书、合同文件等;
- 2、河南正信工程咨询有限公司现场勘验资料。

(二)项目实际完成情况:

我单位于 2025 年 1 月 7 日在栾川县栾川乡人民政府工作人员郭栋，施工单位韩斌等人员在场的情况下，依据现场勘测确认、清单及相关资料审核确认，对栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、8 组公路扩建硬化工程项目中排水管长度、沥青混凝土路面面积、20cm 厚 C25 混凝土路面、25cm 厚 C25 混凝土路面、5cm 沥青混凝土路面、浆砌毛石堰等进行测量和验收，实际完成情况如下：

栾川县栾川乡人民政府百炉村
炉院沟5组、8组公路扩建、硬化工程项目

验收人员签字:		
序号	项目名称	验收工程量
1	挖除旧路面	按实际挖除旧路面签证单
2	改造路面总长度	170.81m (沥青路面) + 731.7m (20cm厚C25砼路面) + 1207m (25cm厚C25砼路面)
3	排水工程 (排水管安装)	35m. 管子为HDPE聚乙烯排水管.
4	边坡防护与加固	① 沥青路面处浆砌边沟边坡防护: 长度: 57.3m 高度: 0.55 + 0.75 + 0.74 + 0.73 + 1.36 + 2.3 + 3.4 + 1.2 平均高度: 1.38m ② C25砼路面处浆砌边沟边坡防护: 长度: 69m. 高度: 3.8m, 2.9, 2.89, 1.48, 0.5 宽度: 0.8m. 平均高度: 2.324m.
5	沥青混凝土路面 (面层)	长度: $45.52 + 52.5 + 72.79 = 170.81m$ 宽度: 2.89m, 2.78m, 3.2m, 3.12m, 3.01m, 3.7m, 3.21m, 4.03m, 4.69m, 4.5m, 4.05m, 3.18m 平均宽度: 3.53m 中粒式沥青砼路面面积: $S = 170.81 \times 3.53 = 602.9m^2$

栾川县栾川乡人民政府百炉村
炉院沟5组、8组公路扩建、硬化工程项目

验收人员签字:		
序号	项目名称	验收工程量
6	水泥混凝土路面 C25 20cm厚 砼路面	长度: 731.7m. 宽度: 4.5m, 4.5m, 5.04m, 5.08m, 5.2m, 3.98m, 6.2m, 5.43m, 3.78m, 5.0m, 4.5m, 5.4m. 平均宽度: 4.88m. 20cm厚C25砼路面面积: $S = 731.7 \times 4.88 = 3570.7 \text{m}^2$
7	水泥混凝土路面 C25 25cm厚 砼路面	第一段: $L = 545\text{m}$. 宽度: 6.2m, 6.0m, 5.3m, 5.9m, 6.0m, 6.0m, 5.9m. 平均: 5.9m. $S_1 = 545 \times 5.9 = 3215.5 \text{m}^2$, 厚度: 25cm ~ 30cm. 第二段: $L = 662\text{m}$. 宽度: 6.35, 5.76, 5.92, 5.9, 6.1, 6.1, 6.5, 6.35, 6.07 平均宽度: 6.12m. $S_2 = 4051.44 \text{m}^2$, 厚度: 20cm ~ 25cm
8	培路肩	无.

备注: 根据招标文件, 栾川百炉沟村8组公路原设计支线路面为20cm厚C25砼, 长度606m, 宽度为6m, 但是根据现场实际情况, 606m支线路长度不能满足居民使用需求, 又由于资金有限, 故根据实际情况, 路面长度加长, 宽度变窄来满足使用需求, 具体长度、宽度按照施工实际尺寸计算。

项目竣工审核验收结论:

栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、8 组公路扩建硬化工程项目清单已由监理单位成泸工程咨询有限公司栾川分公司报告认定该项目质量合格。我单位进行工程量审核验收,该项目已完成建设。

本项目竣工审核验收报告仅供委托人办理栾川县栾川乡人民政府白炉村炉院沟 5 组、8 组公路扩建硬化工程项目验收事宜提供工程量参考依据，不得用作其他用途。

编制人：



审核人：




河南正信工程咨询有限公司



2025 年 1 月 20 日





附件 1 (20cm 厚 C25 混凝土路面测量图片)

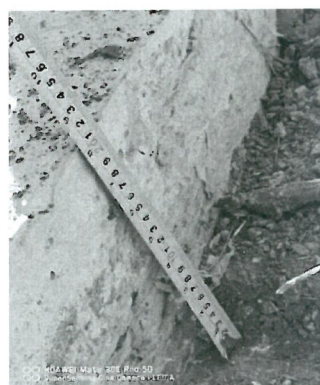

附件 2（沥青混凝土路面测量图片）

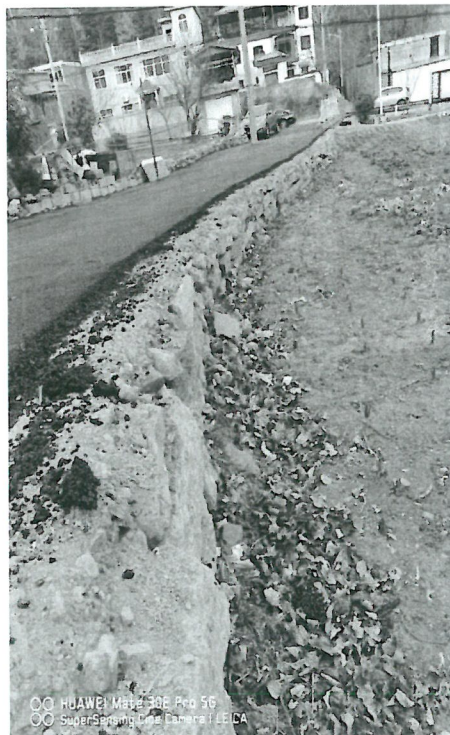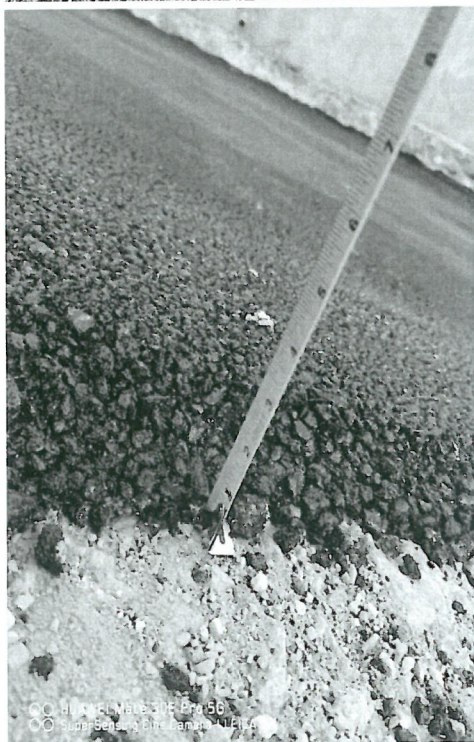

附件 3 (25cm 厚 C25 混凝土路面测量图片) 第一段

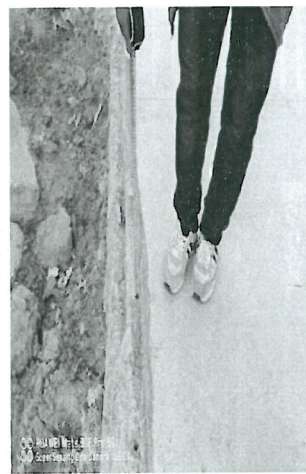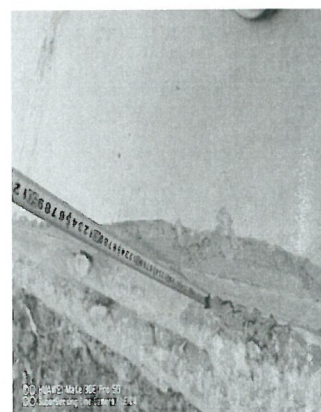

附件 4（25cm 厚 C25 混凝土路面测量图片）第二段

