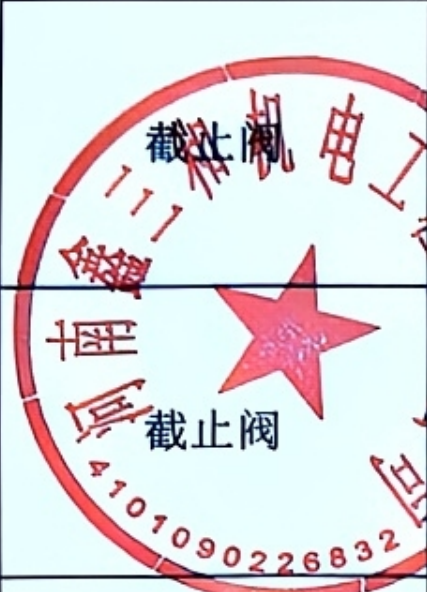



物资设备接收单

单位：元

项目名称	2026 年温县铁棍山药（怀药）冷链仓储建设项目		
采购编号	温财招标采购-2026-7		
中标(成交)单位	河南鑫三和机电工程有限公司		
中标(成交)金额	3127413.00		
设备接收时间			
设备名称	型号规格及技术参数	单位	数量
制冷机组	1. 压缩机型号：2*SRL200E+1*SRL240E； 2. 在工况为-7℃/+36℃时，制冷量为 408.7kw，输入功率为 128.6kw； 3. 型号：投标人自行提报； 4. 配置要求：机组需配套有油分离器、储液器、油冷却器、控制阀门等； 5. 电控要求：配套电控柜喷塑外壳，PLC 控制，高清触摸屏，带远程监控； 6. 包含容器报检。	套	1
蒸发式冷凝器	1. 名称：顺流式蒸发冷凝器； 2. 型号：投标人自行提报； 3. 技术要求：换热量≥1165kw，盘管要求一体成型、整体热浸锌，外壳采用镀铝锌板，PVC 蜂窝式横流填料； 4. 带水箱加热。	台	1
冷风机	1. 名称：氟用吊顶式冷风机； 2. 型号：投标人自行提报； 3. 参数要求： 蒸发温度-7℃时，换热量≥45kw； 4. 材质要求：铜管铝片，喷塑外壳，合金扇叶，施乐百电机，电化霜。	台	4
冷风机	1. 名称：氟用吊顶式冷风机； 2. 型号：投标人自行提报； 3. 参数要求： 蒸发温度-7℃时，换热量≥36kw； 4. 材质要求：铜管铝片，喷塑外壳，合金扇叶，施乐百电机，电化霜。	台	8
压力调节阀	1. 名称：压力调节阀； 2. 材质：钢制； 3. 规格：DN80； 4. 连接形式：焊接。	只	1

	1. 名称:氟直通式截止阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格:DN65; 4. 连接形式:焊接。	只	1
	1. 名称:氟直通式截止阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格:DN125; 4. 连接形式:焊接。	只	1
截止阀	1. 名称:氟直通式截止阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格:DN40; 4. 连接形式:焊接。	只	4
截止阀	1. 名称:氟直通式截止阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格:DN32; 4. 连接形式:焊接。	只	8
电磁阀	1. 名称:电磁阀; 2. 材质:铜阀; 3. 规格:Φ35; 4. 连接形式:焊接。	只	12
球阀	1. 名称:球阀; 2. 材质:铜阀; 3. 规格:Ø28; 4. 连接形式:焊接。	只	12
干燥过滤器	1. 名称:干燥过滤器; 2. 材质:钢制; 3. 规格:1-1/8ODF; 4. 连接形式:焊接。	只	12
膨胀阀	1. 名称:热力膨胀阀; 2. 材质:铜阀; 3. 规格:外平衡式; 4. 连接形式:焊接。	只	12
无缝钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件); 2. 材质、压力等级:Φ133\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	36
无缝钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件); 2. 材质、压力等级:Φ89\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	36

	1. 名称:无缝钢管 (含管件); 2. 材质、压力等级:Φ76\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	78
无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 (含管件); 2. 材质、压力等级:Φ57\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	54
无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 (含管件); 2. 材质、压力等级:Φ45\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	54
无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 (含管件); 2. 材质、压力等级:Φ38\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	60
无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 (含管件); 2. 材质、压力等级:Φ32\20#\GB/T8163; 3. 连接形式:焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道酸洗、气压试验、真空试验; 5. 含焊接压力报检。	米	12
紫铜管	1. 名称:紫铜管 (含管件); 2. 材质、压力等级:Φ28\T2M\GB/T17791; 3. 连接形式:焊接; 4. 设备需进行压力试验及吹、洗设计要求, 含管道酸洗、气压试验、真空试验。	米	30
保温瓦壳	1. 绝热材料品种:聚异氰脲酸酯 (PIR); 2. 规格:Φ133;品牌:利高; 3. 绝热厚度:50mm; 4. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	36
保温瓦壳	1. 绝热材料品种:聚异氰脲酸酯 (PIR); 2. 规格:Φ89; 品牌:利高; 3. 绝热厚度:50mm; 4. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	36

保温瓦壳	1. 绝热材料品种:聚异氰脲酸酯 (PIR) ; 2. 规格: Φ76; 品牌:利高; 3. 绝热厚度:50mm; 4. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	45
保温瓦壳	1. 绝热材料品种:聚异氰脲酸酯 (PIR) ; 2. 规格: Φ57; 品牌:利高; 3. 绝热厚度:50mm; 4. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	50
铝板	1. 材料:铝合金板保护层; 2. 厚度:0.4mm; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	m ²	10
铝箔布	1. 材料:铝箔布; 2. 厚度:0.15mm; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	m ²	100
橡塑保温	1. 名称:橡塑海绵保温, 阻燃 B1 级; 2. 绝热厚度:30mm; 品牌:华美; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	m ²	5
橡塑保温管	1. 名称:橡塑海绵保温, 阻燃 B1 级; 2. 规格: Φ45; 品牌:华美; 3. 绝热厚度:30mm; 4. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	24
橡塑保温管	1. 名称:橡塑海绵保温, 阻燃 B1 级; 2. 规格: Φ28; 品牌:华美; 3. 绝热厚度:30mm; 4. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	20
氟利昂	1. 名称: R507; 品牌: 巨化 2. 符合国家检测标准。	公斤	1050
冷冻油	1. 螺杆机专用; 2. 符合国家检测标准。	升	160
PVC 管	Φ32, 管件、管帽等	米	70
蒸发器吊架	1. 安装部位:冷风机固定; 2. 材质:镀锌型钢, 镀锌通丝; 3. 要求: 防腐、保温, 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	套	12
管道支架	1. 安装部位:制冷管道固定, 自行深化设计; 2. 材质:镀锌型钢 ; 3. 要求: 防腐、保温, 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	批	1
钢结构机房	1. 结构材料:H 型钢、镀锌方管、岩棉板、门、窗户; 2. 外形尺寸:4700*3300*4100mm; 3. 机组基础: 碎石、钢筋编网、混净土水泥; 4. 机房顶部承重: 不小于 12T; 5. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	套	1

辅材及配件	1. 保温胶、发泡料、焊材、气体、压力管道焊接等; 2. 含管道安装。	批	1
区域控制柜	1. 外壳材质: 喷塑; 2. 安装方式: 壁挂式; 3. 显示: 温度、湿度, 显示精度 0.1; 4. 其他: 元器件采用国标产品。	台	6
冷库灯	1. 一体化 LED 三防灯; 2. 电源: 220VAC, 功率 50W; 3. 安装方式: 吸顶式; 4. 防护等级: IP66; 3. 吸顶安装。	个	60
电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: ZC-KVVR-3x4mm ² +1x6mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	360
电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: ZC-KVVR-3x1.5mm ² +1x1mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	400
电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: ZC-KVVR-3x2.5mm ² +1x1mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	50
控制电缆	1. 名称: 控制电缆; 2. 型号: ZC-RVV-3x0.5mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	350
控制电缆	1. 名称: 控制电缆; 2. 型号: ZC-RVV-2x1.5mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	350
控制电缆	1. 名称: 控制电缆; 2. 型号: ZC-RVV-2x0.5mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	600
控制电缆	1. 名称: 控制电缆; 2. 型号: ZC-RVV-10x0.5mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	380
电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: ZC-KVVR-3x10mm ² +2x6mm ² ; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	380
桥架	1. 名称: 电缆桥架; 2. 型号及规格: 150x100mm; 3. 材质: 镀锌; 4. 其他: 具体详见施工图纸及招标文件, 满足施工及验收规范。	米	68

桥架	1. 名称: 电缆桥架; 2. 型号及规格: 100x50mm; 3. 材质: 镀锌; 4. 其他: 具体见图纸及招标文件, 满足施工及验收规范。	米	170
镀锌穿线管	1. 名称: 镀锌穿线管; 2. 型号: 国标要求; 3. 要求: 施工完毕满足施工及验收规范, 达到验收标准。	米	210
支吊架及辅料	1. 镀锌角铁、胶布、线鼻、防火泥等; 2. 含布线、安装等。	批	1
聚氨酯夹芯板	1. 板材类型: 机制板; 2. 整板厚度: 100mm; 3. 容重: $40 \pm 2 \text{Kg/m}^3$, 抗压强度不小于 160kPa; 4. 板材属性: 防静电涂层; 5. 板材材质: 双面彩钢, 冠洲板, 0.5mm 厚; 6. 防火等级: B1 级; 7. 含内外包角。	m^2	3740
挤塑板	1. 名称: XPS 挤塑板; 2. 抗压强度: $\geq 250 \text{kPa}$; 3. 阻燃等级: B2 级; 4. 容重: 不低于 28Kg/m^3 ; 5. 含上下层防水膜; 6. 含铺设。	m^2	1641
库体支撑	1. 安装部位: 库板支撑、墙板固定, 自行深化设计; 2. 材质: 镀锌型材; 3. 防腐、保温及标识形式: 按设计及规范要求; 4. 含安装。	m^2	1641
离心式风幕机	1. 材质: 轴流式喷塑风幕机; 2. 规格: 配套门洞 2200mm*2600 使用; 3. 电源: 380VAC; 4. 类型: 离心式; 5. 其他: 投标人根据经验及使用要求自行深化报价, 提供品牌型号及参数。	台	6
齿条式电动单开平移门	1. 规格: 门口 2.2*2.6m 高; 2. 厚度: 100 厚门扇+0.6mm 彩钢面板, 加内开门器; 3. 形式: 电动单开; 4. 材料: 门樘、上下滑道及门边框均为铝合金型材; 配彩钢滑道罩及 0.8 厚不锈钢门洞包扣; 5. 含安装。	扇	4
齿条式电动双开平移门	1. 规格: 门口 2.2*2.6m 高; 2. 厚度: 100mm 厚门扇+0.6mm 彩钢面板; 3. 形式: 电动双开; 4. 材料: 门樘、上下滑道及门边框均为铝合金型材; 配彩钢滑道罩及 0.8 厚不锈钢门洞包扣; 5. 含安装。	扇	2

辅材及配件	1. 发泡料、胶、蘑菇头、铆钉、固定块等; 2. 含安装。	批	1
监控摄像机	1. 无死角高清夜视; 2. 网线+电源供电; 3. 手机推送; 4. 硬盘。	个	8
硬盘录像机	1. 接入路数: 8 路; 2. 网线供电; 3. 存储容量: 2TB。	台	1
显示器	1. 尺寸: 不小于 24 寸; 2. 直面屏; 3. 分辨率: 不低于 1920*1080。	台	1
线缆	带辅料、网线、电源线、电缆接头等。	批	1
制冷机组云操作系统	1 手机 APP、电脑, 远程显示及操作设备运行; 2. 实时显示运行数据, 记录机组运行情况。	套	1
移动式货架	1. 规格: 1500mm*1300mm*1350mm (高); 2. 承重: 不小于 1000kg; 3. 立柱: 方管 50*50*1.5mm 等; 4. 净重: 不低于 75kg; 5. 热镀锌。	套	1560
电动叉车	1. 名称: 电动叉车; 2. 额定载荷: 3000kg; 3. 三级 5 米门架。	台	2
变压器	1. 一体式; 2. 容量: 315kVA; 3. 含安装。	台	1

建设单位意见: 设备已到场, 经调试可正常使用

验收人:



2026 年 7 月 24 日
